



## U様邸新築工事の Part 2 現場日記

前回の情報誌で紹介したU様邸ですが、4月14日に庭の工事を除いて完成致しました！  
U様、おめでとうございます。そして今回も取材にご協力頂きありがとうございます！！



**A**【2月2日】天井の気密工事が終わり、断熱材を充填した。写真は屋根裏物置の床、玄関部の天井にあたる部分だ。セルロースブローイングで35cm以上充填している。これで断熱工事はすべて終わりだ。



**B**【2月15日】気密測定をした。これで1㎡あたりにどれだけの隙間があるかがわかる。測定中に風が入ってくる部分を見つければ気密の甘い部分もわかる。今回は水道管の周囲が甘かったようだ。ウレタンで塞いで測定をやり直した。結果は相当隙間面積0.22㎢を記録した。チャコの家の合格基準値の0.30㎢をクリアでき、ホッとした。



**C**【3月14日】大工工事は終わり、内装工事は仕上げ工事を進めている。親世帯の玄関は珪藻土仕上げで、調湿効果も期待出来る。クロスのような継ぎ目は無く、左官屋さんが付ける模様が味わい深い。外構はアプローチや、駐車スペースのコンクリート工事を進めている。仮設の玄関ドアはハウスクリーニング後に取り替える予定だ。

◎LDK…壁付けテレビの左右に飾り棚を設けた。上部にある間接照明の光がガラス製の棚板を通り抜けて下まで照らしている。調光式で明るさも自在だ。テレビの配線は裏の階段下収納でまとめている為スッキリしている。襖を開けると奥行きのある広い空間になる。




**完成!!**



◎和室…障子の格子の模様から仏間扉の模様にかけて半円が繋がっている。U様の提案だ。上品で遊び心のある空間に仕上がった。

◎脱衣室…奥様の嫁入り道具の収納家具を加工して埋め込んだ。裏の家事室と繋がっていて洗濯物を両側から出し入れできて実用性バツグンだ。

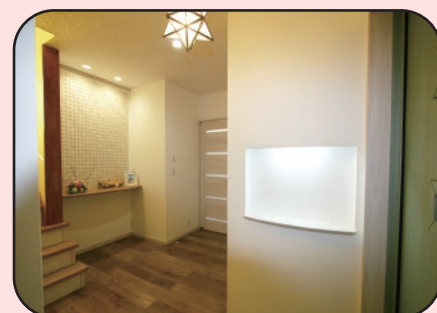

◎子世帯玄関…ドアを開けるとダウンライトに照らされるタイルの壁が目につく。吊下がっている照明器具もオシャレだ。

◎ウォークインクローゼット…とは言っても多目的だ。青い棒は懸垂などのトレーニングに耐える作りだ。棚の奥にはドレッサーと、PCスペースもある。
